



UNP



Informe

DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL
DE INVERSIONES

II Trimestre del 2025

22 de agosto del 2025

DEP-FT-11-V4

Direccionamiento Estratégico y Planeación

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

17/10/2024

A solid green horizontal bar at the bottom of the page.

Tabla de Contenido



1.	INTRODUCCIÓN.....	3
2.	OBJETIVO	3
3.	METODOLOGÍA.....	4
4.	ALCANCE.....	4
5.	FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS	4
6.	SEGUIMIENTO.....	5
7.	RESULTADOS Y AVANCE	7
8.	REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS	10
9.	RECOMENDACIONES	10
	9.1. <i>Generales</i>	10
	9.2. <i>Específicas</i>	10
10.	RIESGOS IDENTIFICADOS	11
11.	CONCLUSIONES.....	11
12.	ANEXOS Y SOPORTES.....	11



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Decreto 111 de 1996 y lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10, el Plan Operativo Anual de Inversiones tiene como objeto priorizar los proyectos de inversión, registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación - DNP, y a los cuales se les haya asignado presupuesto de inversión de acuerdo con la Ley de Presupuesto General de la Nación.

Para la Unidad Nacional de Protección, es necesario adelantar seguimiento a los proyectos de inversión y compromisos de la vigencia, que contribuyan con el logro de las metas institucionales en materia de inversión.

Para tal fin, la Oficina Asesora de Planeación e Información, en su rol de segunda línea de defensa establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión ha realizado el informe de seguimiento del segundo trimestre del 2025 al Plan Operativo Anual de Inversiones POAI para la vigencia 2025, el cual refleja el cumplimiento al plan de acción (entregables, actividades metas y presupuesto) del proyecto de Inversión BPIN 20240000000022 “*Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección*” del proyecto de inversión BPIN 202400000000144 “*Fortalecimiento del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional*” y del proyecto de inversión BPIN 202400000000167 “*Fortalecer las capacidades institucionales del talento humano y de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la UNP a nivel nacional*” junto con las dificultades que se han presentado.

Lo anterior, con el propósito de alertar oportunamente a los gerentes de los proyectos de la ejecución, sobre las diferencias entre lo planeado y lo ejecutado y los impactos que esto genera en los niveles de ejecución presupuestal para el rubro de inversión.

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento de la meta física y financiera del proyecto de inversión BPIN 20240000000022 “*Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección*” del proyecto de inversión 202400000000144 “*Fortalecimiento del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional*” y del proyecto de inversión 202400000000167 “*Fortalecer las capacidades institucionales del talento humano y de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la UNP a nivel nacional*” para la vigencia 2025.



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

3. METODOLOGÍA

Es oportuno indicar que el seguimiento se realiza a partir de los datos del sistema integrado de información financiera, plataforma integrada de inversión pública y resúmenes ejecutivos suministrado por el gerente del proyecto de inversión BPIN 202400000000022 “*Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional*” y por el gerente del proyecto de inversión BPIN 202400000000144 “*Fortalecimiento del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional*”

Con respecto al proyecto de inversión BPIN 202400000000167 “*Fortalecer las capacidades institucionales del talento humano y de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la UNP a nivel nacional*” informamos que no ha iniciado ejecución y por ende no cuenta con reporte de avance de ejecución en la plataforma integrada de inversión pública y reporte de ejecución en el sistema integrado de información financiera.

4. ALCANCE

Con el presente seguimiento se analiza el avance de ejecución física y presupuestal del proyecto de inversión BPIN 202400000000022 “*Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional*” y del proyecto de inversión BPIN 202400000000144 “*Fortalecimiento del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional*” correspondiente al segundo trimestre del 2025.

Ahora bien, para el proyecto de inversión BPIN 202400000000167 “*Fortalecer las capacidades institucionales del talento humano y de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la UNP a nivel nacional*” no se reporta avance de ejecución física y presupuestal al segundo trimestre del 2025, toda vez que se continua con la validación del trámite de planear la ejecución como requisito del sistema integral de seguimiento del Departamento Nacional de Planeación para iniciar la ejecución.

5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

La fuente de información para el presente informe fue recopilada a través del resumen ejecutivo del proyecto de inversión BPIN 202400000000022



Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional” y del proyecto de inversión BPIN 202400000000144 “Fortalecimiento del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional” establecida para su seguimiento y del reporte de avance presupuestal de la plataforma integrada de inversión pública así como del reporte del sistema integrado de información financiera SIIF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

6. SEGUIMIENTO

6.1 PROYECTO DE INVERSIÓN BPIN 20240000000022 FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

Es oportuno indicar que para este trimestre se avanzó en la meta del indicador del producto sistema de gestión documental actualizado en el cual la Secretaria General a través del grupo de gestión documental realizó la organización de 70 metros lineales de archivo central para el entregable archivo formados mediante la ejecución de la reserva presupuestal del contrato No. 2555 del 2024 suscrito Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S. por \$450.000.000.

Proyecto	Programa	Producto	Indicador de Producto	Meta	Entregables	Avance físico del producto	Presupuesto asignado 2025	Avance Financiero
BPIN 20240000000022 Fortalecimiento del Proceso de Gestión Documental de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional	3799-Fortalecimiento de la gestión y Dirección del sector interior	Servicio de gestión documental actualizado	Sistema de gestión documental actualizado	0.027	Archivos formados	70%	93.094.175	0%
					Documentos con acceso para la consulta	0%	0	0%
					Sistema integrado de conservación implementado	0%	35.000.000	0%
					Total, Presupuesto		128.094.175	

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública MGA WEB.

6.2. PROYECTO DE INVERSIÓN BPIN 202400000000144 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL”

Para este trimestre no se reportó avance en la meta del indicador del producto Grupos en riesgo extraordinario y extremo protegidos, indicador de producto Personas en riesgo extraordinario y extremo protegidas e indicador de producto Personas capacitadas con educación informal, toda vez que se adelantó en el marco del proceso precontractual la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la adquisición de vehículos blindados nivel



 Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES	 Interior
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

IIIA en el marco del producto Servicio de Protección Colectiva en riesgo extraordinario y extremo, la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la adquisición de vehículos blindados nivel IIIA en el marco del producto Servicio de Protección Individual en riesgo extraordinario y extremo y la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal para el producto Servicio de educación informal en temas de protección colectiva en riesgo extraordinario y extremo, orientado al fortalecimiento del programa de prevención y protección.

Proyecto	Programa	Producto	Indicador de Producto	Meta	Actividades	Avance físico del producto	Presupuesto asignado 2025	Avance Financiero
BPIN 202400000000144 Fortalecimiento del programa de prevención y protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional	3705 - Protección de personas, grupos y comunidades en riesgo extraordinario y extremo Unidad Nacional de Protección (UNP)	Servicio de Protección Colectiva en riesgo extraordinario y extremo	Grupos en riesgo extraordinario y extremo protegidos	2	Adquirir vehículos fluviales para la implementación de las medidas de protección Colectiva	0%	0	0%
					Adquirir motos para implementación de las medidas de protección colectiva	0%	0	0%
					Adquirir vehículos blindados nivel III para implementación de las medidas de protección colectiva	0%	0	0%
					Adquirir vehículos blindados nivel IIIA para implementación de las medidas de protección colectiva	0%	848.769.306	0%
		Servicio de Protección Individual en riesgo extraordinario y extremo	Personas en riesgo extraordinario y extremo protegidas	2	Adquirir vehículos blindados nivel III para implementación de las medidas de protección individual	0%	0	0%
					Adquirir vehículos blindados nivel IIIA para implementación de las medidas de protección individual	0%	848.769.306	0%
		Servicio de educación informal en temas de protección colectiva en riesgo extraordinario y extremo.	Personas capacitadas con educación informal	1.413	Desarrollar promoción del programa de prevención y protección de la ruta colectiva con enfoque integral	0%		0%
					Desarrollar promoción del programa de prevención y protección a los entes territoriales que tengan responsabilidad normativa	0%	522.243.108	0%
					Elaborar los estudios y el diseño de la dotación de la Unidad móvil	0%	0	0%
					Adquirir unidades móviles dotadas para la estrategia de prevención y protección de la ruta colectiva	0%	0	0%
Total, Presupuesto					2.219.781.720			

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública MGA WEB.

6.3. PROYECTO DE INVERSION BPIN 202400000000167 “FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL TALENTO HUMANO Y DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LA UNP A NIVEL NACIONAL



Para este trimestre no se reportó avance en la meta del indicador del producto Personas capacitadas e indicador de producto Sistemas de información implementados, debido a que se continuo con la validación del trámite de planear la ejecución línea base cero, además se está estudiando los perfiles a contratar, objeto, obligaciones y entregables para los 2 componentes del proyecto con el fin de poder iniciar su primer año de ejecución.

Proyecto	Programa	Producto	Indicador de Producto	Meta	Actividades -Entregables	Avance físico del producto	Presupuesto asignado 2025	Avance Financiero
202400000000167 Fortalecimiento de las capacidades institucionales del talento humano y de la infraestructura tecnológica y de servicios de la UNP a nivel nacional	3799-Fortalecimiento de la gestión y Dirección del sector interior	Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa	Personas capacitadas	0	Diseñar programas académicos especializados en Riesgo y Protección en seguridad humana.	0%	240.000.000	0%
					Crear la "Escuela de Formación UNP" como programa acreditado por las secretarías de Educación y Gobernaciones	0%	86.062.053	0%
					Formar la primer cohorte de personas con conocimientos académicos y por competencias laborales en Riesgos y Protección.	0%	0	0%
		Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	0	Implementación del sistema	0%	0	0%
					Diseño técnico y funcional	0%	326.062.052	0%
					Total, Presupuesto		652.124.105	

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública MGA WEB.

7. RESULTADOS Y AVANCE

Desde el Grupo de Planeación Institucional y gestión de la información se han realizado mesas de trabajo de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión con los responsables del proceso.

Para el proyecto de inversión BPIN 202400000000022 "*Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional*" se avanzó en la meta del indicador del producto sistema de gestión documental actualizado proveniente del entregable Archivos formados en el cual se intervinieron 70 metros lineales de archivo central ejecutados a través de la reserva presupuestal del contrato 2555 del 2024 suscrito con Archivos del Estado y Tecnologías de la Información S.A.S por \$450.000.000.


No se reportó avance físico y financiero para el proyecto de inversión BPIN 202400000000144 "*Fortalecimiento del programa de prevención y protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional*" toda vez que se está gestionando en la etapa precontractual la expedición de los Certificados de



Disponibilidad Presupuestal para el producto Servicio de Protección Colectiva en riesgo extraordinario y extremo, para el producto Servicio de Protección Individual en riesgo extraordinario y extremo y para el producto Servicio de educación informal en temas de protección colectiva en riesgo extraordinario y extremo.

Adicionalmente, se elaboró el anexo técnico el cual está en fase de cotización. Esta etapa tiene como objetivo recabar información técnica, operativa y presupuestal de proveedores del sector, con el fin de determinar la modalidad de contratación más adecuada, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

Con respecto al proyecto de inversión BPIN 20240000000167 “*Fortalecer las capacidades institucionales del talento humano y de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la UNP a nivel nacional*” se adelantó el trámite de ajuste al decreto por un valor \$ 652.124.105 el cual fue aprobado por el Departamento Nacional de Planeación el 23 de mayo del 2025

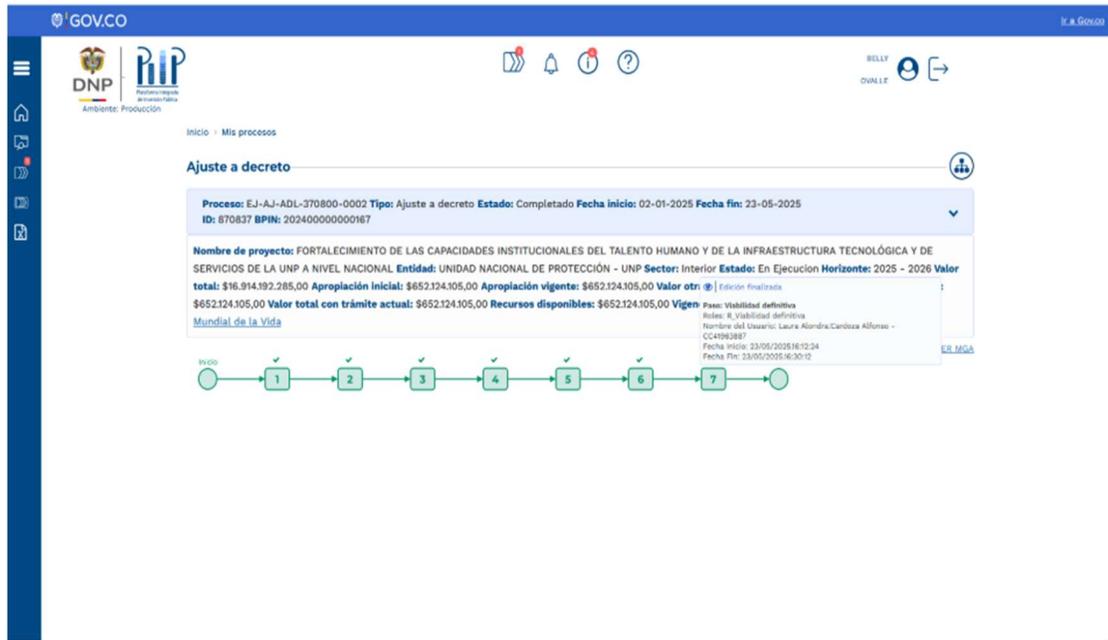

Ajuste a decreto

Proceso: EJ-AJ-ADL-370800-0002 Tipo: Ajuste a decreto Estado: Completado Fecha inicio: 02-01-2025 Fecha fin: 23-05-2025
 ID: 870837 BPIN: 20240000000167

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL TALENTO HUMANO Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE SERVICIOS DE LA UNP A NIVEL NACIONAL Entidad: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP Sector: Interior Estado: En Ejecución Horizonte: 2025 - 2026 Valor total: \$16.914.192.285,00 Aprobación inicial: \$652.124.105,00 Aprobación vigente: \$652.124.105,00 Valor otr: \$0,00 Etación Finalizada

Mundial de la Vida

País: Viabilidad definitiva
 Rol del Usuario: Viabilidad definitiva
 Nombre del Usuario: Laura Alejandra Cardoza Alfonso - CC41962887
 Fecha inicio: 23/05/2025 16:12:34
 Fecha Fin: 23/05/2025 16:30:12

Proceso: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7

Posterior a lo cual se llevó a cabo la consulta y validación del catálogo de productos Estructura de Desglose de Trabajo EDT del Departamento Nacional de Planeación específicamente para el entregable diseño técnico y funcional y



entregable implementación del sistema en el marco del producto Servicios de información implementados.

En tal sentido, se escogió del catálogo de productos Estructura de Desglose de trabajo EDT, 3 entregables nivel 2 con sus respectivas actividades estandarizadas para ser programado en el trámite de planear la ejecución línea base cero en el entregable Diseño técnico y funcional.

Producto	Desagregar Estructura de desglose de trabajo EDT		Actividad
	Entregable Nivel 1	Entregable Nivel 2	
Servicio de información implementado	Diseño técnico y funcional	Arquitectura del sistema	Definir los ambientes de desarrollo y productivos
			Definir los atributos de calidad del sistema de información
			Elaborar el diseño de arquitectura del sistema de información
		Tecnologías de desarrollo	Definir el esquema de infraestructura
			Definir el motor de base de datos
			Definir lenguajes de programación
		Arquitectura institucional	Planear el marco de referencia de arquitectura institucional para el grupo del servicio al ciudadano
			Definir la visión de arquitectura institucional para el grupo del servicio al ciudadano
			Consolidar la hoja de ruta para la implementación de la arquitectura institucional proyectada para el grupo del servicio al ciudadano

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública

También, se escogió del catálogo de productos Estructura de Desglose de trabajo EDT ,3 actividades estandarizadas para ser programado en el trámite de planear la ejecución línea base cero en el entregable Implementación del sistema.



Producto	Desagregar Estructura de Desglose de trabajo EDT	
	Entregable Nivel 1	Actividad
Servicio de información implementado	Implementación del sistema	Elaborar el plan de sensibilización del sistema de información
		Elaborar la documentación técnica del sistema de información
		Realizar capacitaciones para la apropiación del sistema

Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública

Aunado a ello, se inició el estudio de los perfiles a contratar, objeto, obligaciones y entregables para el producto Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa y para el producto Servicios de información implementados.

Por lo tanto no se reporta avance físico y financiero del proyecto en mención.

8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

No Aplica

9. RECOMENDACIONES

9.1. Generales

La Oficina Asesora de Planeación e información en su rol de segunda línea de defensa, recomienda a los gerentes de los proyectos de inversión adelantar las acciones oportunas para cumplir con los requerimientos del Proyecto, de acuerdo con la programación prevista, más aún considerando que se está próximo al cierre de la vigencia.

9.2. Específicas

Realizar monitoreo continuo de la ejecución de los recursos de inversión para detectar alertas tempranas. Esto facilitará que la entidad tome decisiones fundamentadas en datos con el fin de gestionar eficientemente los recursos y mejorar el desempeño de la ejecución presupuestal.



10. RIESGOS IDENTIFICADOS

Demora en el trámite de planear la ejecución en el marco del sistema integral de seguimiento del DNP del proyecto de BPIN 202400000000167 “*Fortalecer las capacidades institucionales del talento humano y de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la UNP a nivel nacional*” ocasionando retraso en el proceso precontractual y contractual para iniciar el primer año de ejecución.

11. CONCLUSIONES

Validar las alertas generadas de los informes de seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones que se elaboran y publican trimestralmente, con el propósito de que se implementen acciones de mejora de manera oportuna para asegurar el cumplimiento de las metas físicas de los productos propuestos y la ejecución presupuestal del recurso total asignado.

12. ANEXOS Y SOPORTES

Las evidencias reportadas en este informe se encuentran en la carpeta C:\Users\nubia.angel\OneDrive - Unidad Nacional de Protección\Documentos\INFORMES PROYECTOS DE INVERSION UNP

JAVIER FRANCISCO RODRÍGUEZ MORENO
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Nubia Stella Angel Casallas		22/08/2025
Revisó	Adriana Yaneth Santander Arias		
Aprobó	Javier Francisco Rodriguez Moreno		

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.

